47 GIIN Proyectos de Ingenieria del Software

Entrega Product Backlog

Francisco Espada Esparcia 12/11/2025

Índice

1. Introducción
2. Descripción general del sistema
3. Épicas del proyecto
    3.1. Tabla resumen de épicas
4. Historias de usuario
    4.1. Tabla resumen de historias
    4.2. Correspondencia Épica - Historias de Usuario - Sprint
5. Distribucion por Sprints
    5.1. Sprint 1
    5.2. Sprint 2
    5.3. Sprint 3
6. Conclusiones
7. Enlaces al proyecto
    Jira
    GitHub

1. Introducción.

El objetivo de este documento es recoger el product backlog del proyecto SIGE-ALM.

El objetivo del backlog es definir y priorizar todas las funcionalidades necesarias para implementar el sistema de gestión de almacén, siguiendo la metodología ágil Scrum.
Cada funcionalidad se descompone en épicas e historias de usuario, priorizadas y estimadas mediante Story Points, y distribuidas en tres sprints según el cronograma planificado.

2. Descripción general del sistema

El sistema SIGE-ALM busca digitalizar la gestión de almacén, permitiendo:

- Registrar artículos y materiales.
- Controlar entradas, salidas y devoluciones.
- Asociar materiales a órdenes de trabajo.
- Generar reportes de inventario y alertas de stock.
- Administrar usuarios con roles diferenciados.
- Facilitar la configuración de la organización y pruebas finales.

3. Épicas del proyecto

Cada épica agrupa un conjunto de historias de usuario relacionadas con una funcionalidad principal del sistema.

3.1. Tabla resumen de épicas

Código	**Nombre de la Épica**	**Descripción general**	**Sprint principal**	**Prioridad**
EP-01 SCRUM-7	Gestión de artículos	Crear, consultar, editar y eliminar artículos del inventario.	1-2	Alta
EP-02 SCRUM-8	Movimientos de stock	Registrar entradas, salidas y devoluciones.	1	Alta
EP-03 SCRUM-9	Órdenes de trabajo	Gestionar creación, consulta y estado de las OT.	1	Alta
EP-04 SCRUM-10	Reportes del sistema	Generar y exportar reportes de inventario y movimientos.	2	Media
EP-05 SCRUM-11	Alertas de stock	Detectar stock mínimo y alertar al jefe de almacén.	2	Media
EP-06 SCRUM-12	Usuarios y roles	Alta, consulta y modificación de usuarios y permisos.	1-2	Media
EP-07 SCRUM-13	Proveedores	Registrar y administrar proveedores.	3	Baja
EP-08 SCRUM-14	Configuración del sistema	Datos de organización, logotipo, ajustes.	2	Media
EP-09 SCRUM-15	Ajustes finales	Pruebas, correcciones y documentación final.	3	Alta

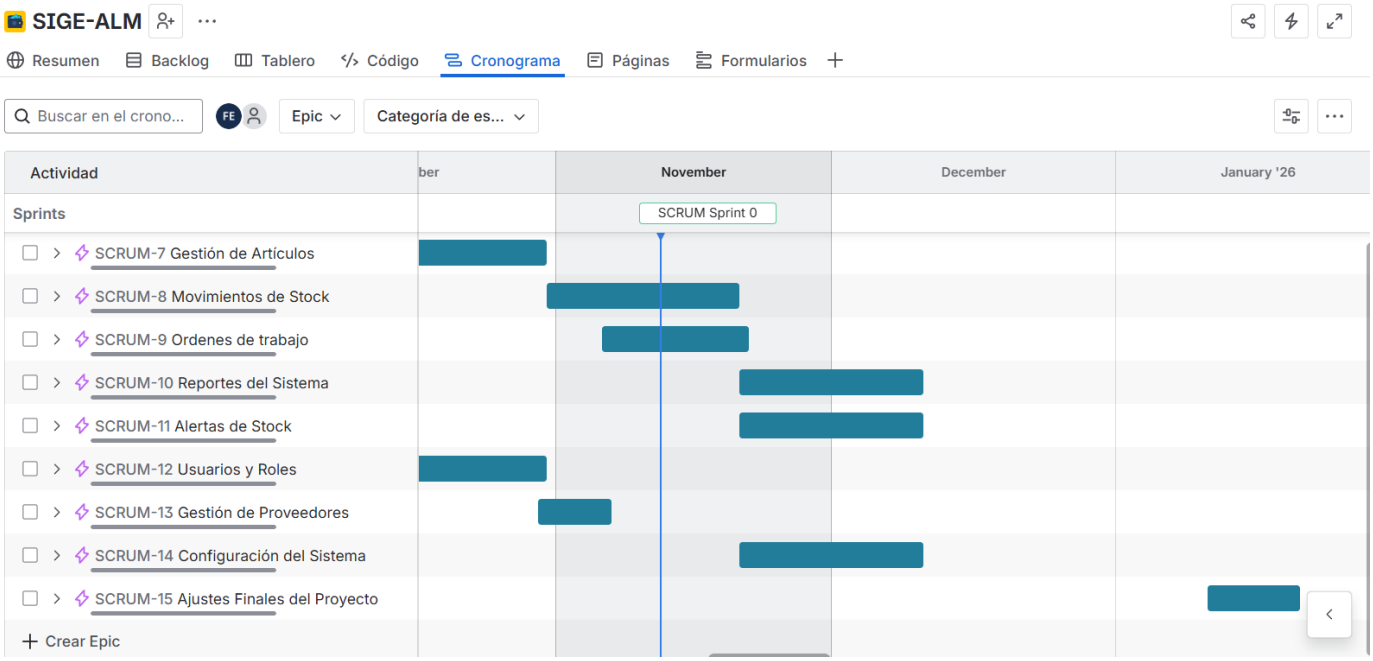

4. Historias de usuario

Cada historia describe una funcionalidad concreta que aporta valor al usuario final.

4.1. Tabla resumen de historias

Código	Épica	Descripción breve	Story Points	Prioridad	Sprint
HU-01	EP-01	Crear artículo	3	Alta	1
HU-02	EP-01	Consultar artículos	2	Alta	1
HU-03	EP-01	Editar artículo	2	Media	2
HU-04	EP-01	Eliminar artículo	2	Media	2
HU-05	EP-01	Ver detalle del artículo	2	Media	2
HU-10	EP-02	Registrar entrada de material	3	Alta	1
HU-11	EP-02	Registrar salida por OT	3	Alta	1

Código	Épica	Descripción breve	Story Points	Prioridad	Sprint
HU-12	EP-02	Registrar devolución	3	Alta	1
HU-13	EP-02	Consultar historial	2	Media	1
HU-14	EP-02	Consultar stock disponible	2	Alta	1
HU-20	EP-03	Crear OT	2	Alta	1
HU-21	EP-03	Consultar OT	2	Media	1
HU-22	EP-03	Actualizar estado de OT	2	Media	1
HU-23	EP-04	Generar reporte inventario	3	Media	2
HU-24	EP-04	Generar reporte movimientos	3	Media	2
HU-25	EP-04	Exportar reportes	2	Media	2
HU-30	EP-05	Generar alerta stock mínimo	3	Media	2
HU-31	EP-05	Consultar alertas	2	Media	2
HU-32	EP-05	Revisar alertas	2	Media	2
HU-40	EP-06	Crear usuario	3	Media	1
HU-41	EP-06	Consultar usuarios	2	Media	2
HU-42	EP-06	Modificar rol	2	Media	2
HU-50	EP-07	Registrar proveedor	3	Baja	3
HU-51	EP-07	Consultar proveedores	2	Baja	3
HU-52	EP-07	Editar proveedor	2	Baja	3
HU-60	EP-08	Configurar datos de organización	2	Media	2
HU-61	EP-08	Configurar logotipo	2	Media	2
HU-70	EP-09	Realizar pruebas finales	3	Alta	3
HU-71	EP-09	Corregir incidencias	2	Alta	3
HU-72	EP-09	Documentación final	3	Alta	3

Sprints

SCRUM-7 Gestión de Artículos

- SCRUM-16 HU-01 Cre... POR HACER FE
- SCRUM-17 HU-02 Co... POR HACER FE
- SCRUM-18 HU-03 Edi... POR HACER FE
- SCRUM-19 HU-04 Eli... POR HACER FE
- SCRUM-20 HU-05 Ve... POR HACER FE

SCRUM-8 Movimientos de Stock

- SCRUM-21 HU-10... POR HACER FE
- SCRUM-22 HU-11 Reg... POR HACER FE
- SCRUM-23 HU-12 Re... POR HACER FE
- SCRUM-24 HU-13 Co... POR HACER FE
- SCRUM-25 HU-14 Co... POR HACER FE

SCRUM-9 Ordenes de trabajo

- SCRUM-26 HU-20 Cr... POR HACER FE
- SCRUM-27 HU-21 Co... POR HACER FE
- SCRUM-28 HU-22 Ac... POR HACER FE

SCRUM-10 Reportes del Sistema

- SCRUM-29 HU-23 Gener... POR HACER
- SCRUM-30 HU-24 Gener... POR HACER
- SCRUM-31 HU-25 Exporta... POR HACER

SCRUM-11 Alertas de Stock

- SCRUM-32 HU-30 Gener... POR HACER
- SCRUM-33 HU-31 Consul... POR HACER
- SCRUM-34 HU-32 Marcar... POR HACER

SCRUM-12 Usuarios y Roles

- SCRUM-35 HU-40 Crear ... POR HACER
- SCRUM-36 HU-41 Co... POR HACER
- SCRUM-37 HU-42 Modifi... POR HACER

- SCRUM-38 HU-50 Re... POR HACER
- SCRUM-39 HU-51 Consul... POR HACER
- SCRUM-40 HU-52 Editar ... POR HACER

SCRUM-14 Configuración del Sistema

- SCRUM-41 HU-60 Config... POR HACER
- SCRUM-42 HU-61 Config... POR HACER

SCRUM-15 Ajustes Finales del Proyecto

- SCRUM-43 HU-70 Realiza... POR HACER
- SCRUM-44 HU-71 Corregi... POR HACER
- SCRUM-45 HU-72 Prepar... POR HACER

4.2. Correspondencia Épica - Historias de Usuario – Sprint

Épica	**Historias asociadas**	**Sprint principal**
EP-01	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05	1-2
EP-02	HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-14	1
EP-03	HU-20, HU-21, HU-22	1
EP-04	HU-23, HU-24, HU-25	2
EP-05	HU-30, HU-31, HU-32	2
EP-06	HU-40, HU-41, HU-42	1-2
EP-07	HU-50, HU-51, HU-52	3
EP-08	HU-60, HU-61	2
EP-09	HU-70, HU-71, HU-72	3

5. Distribucion por Sprints

5.1. Sprint 1

Fechas: 16/10/2025 – 20/11/2025

Código	Historia de Usuario	SP
HU-01	Crear artículo	3
HU-02	Consultar artículos	2
HU-10	Registrar entrada	3
HU-11	Registrar salida por OT	3
HU-12	Registrar devolución	3
HU-13	Consultar historial	2
HU-14	Consultar stock	2
HU-20	Crear OT	2
HU-21	Consultar OT	2
HU-22	Actualizar estado OT	2
Total: 25 SP		

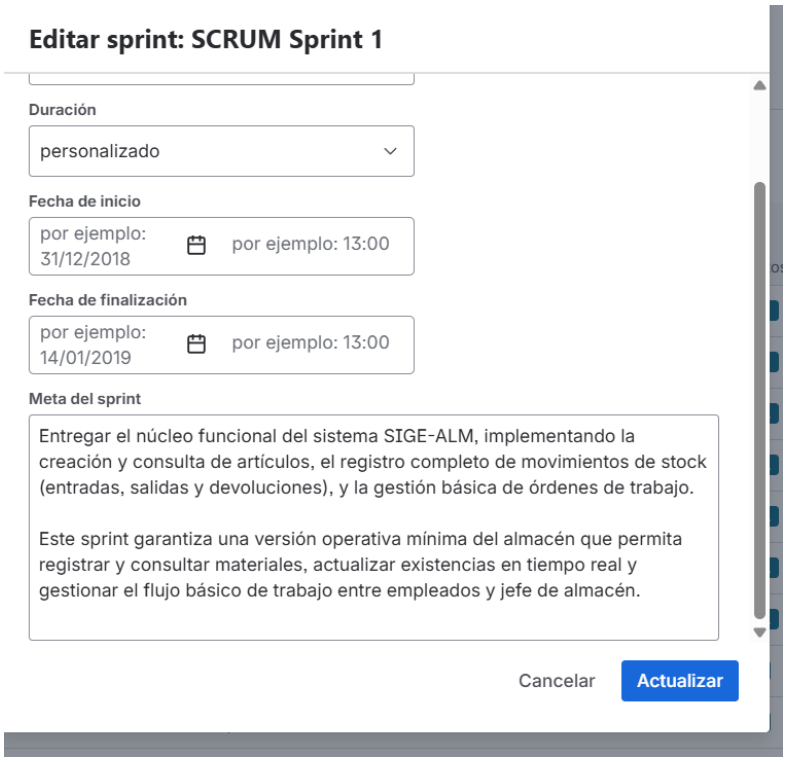

5.2. Sprint 2

Fechas: 21/11/2025 – 10/12/2025

Objetivo: Incorporar reportes, alertas, configuración y gestión avanzada.

Código	**Historia**	**SP**
HU-03	Editar artículo	2
HU-04	Eliminar artículo	2
HU-05	Ver detalle artículo	2
HU-23	Reporte inventario	3
HU-24	Reporte movimientos	3
HU-25	Exportar reportes	2
HU-30	Alerta stock mínimo	2
HU-31	Consultar alertas	2
HU-32	Revisar alertas	2
HU-40	Crear usuario	3
HU-41	Consultar usuarios	2
HU-42	Modificar rol	2
HU-60	Configuración empresa	2
HU-61	Logotipo	2
Total: 31 SP		

5.3. Sprint 3

Fechas: 11/12/2025 – 20/01/2026

Objetivo: Finalizar el sistema con pruebas, correcciones y documentación.

Código	**Historia**	**SP**
HU-50	Registrar proveedor	3
HU-51	Consultar proveedores	2
HU-52	Editar proveedor	2
HU-70	Pruebas finales	3
HU-71	Corregir incidencias	2
HU-72	Documentación final	3
Total: 15 SP		

6. Conclusiones

El Product Backlog de SIGE-ALM define un alcance estructurado, priorizado y viable en tres sprints.
La planificación permite desarrollar de forma incremental el sistema, garantizando entregas funcionales y controladas, conforme a la metodología Scrum.

7. Enlaces al proyecto.

JIRA:

https://metalsword96.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiODk3NGIyNjg0ZTBiNGNmNGJhMjBmMjZjZjE5MDBiOTQiLCJwIjoiaiJ9

GITHUB:

https://github.com/FranciscoEspadaEsparcia/SIGE-ALM
